Meilenstein-, Ausführungsplanungs-, Ausschreibungs-, Ausführungs-Terminplan - Energetische Sanierung der Kultur- und Sporthalle Ebersdorf

Stand: 27.11.2025
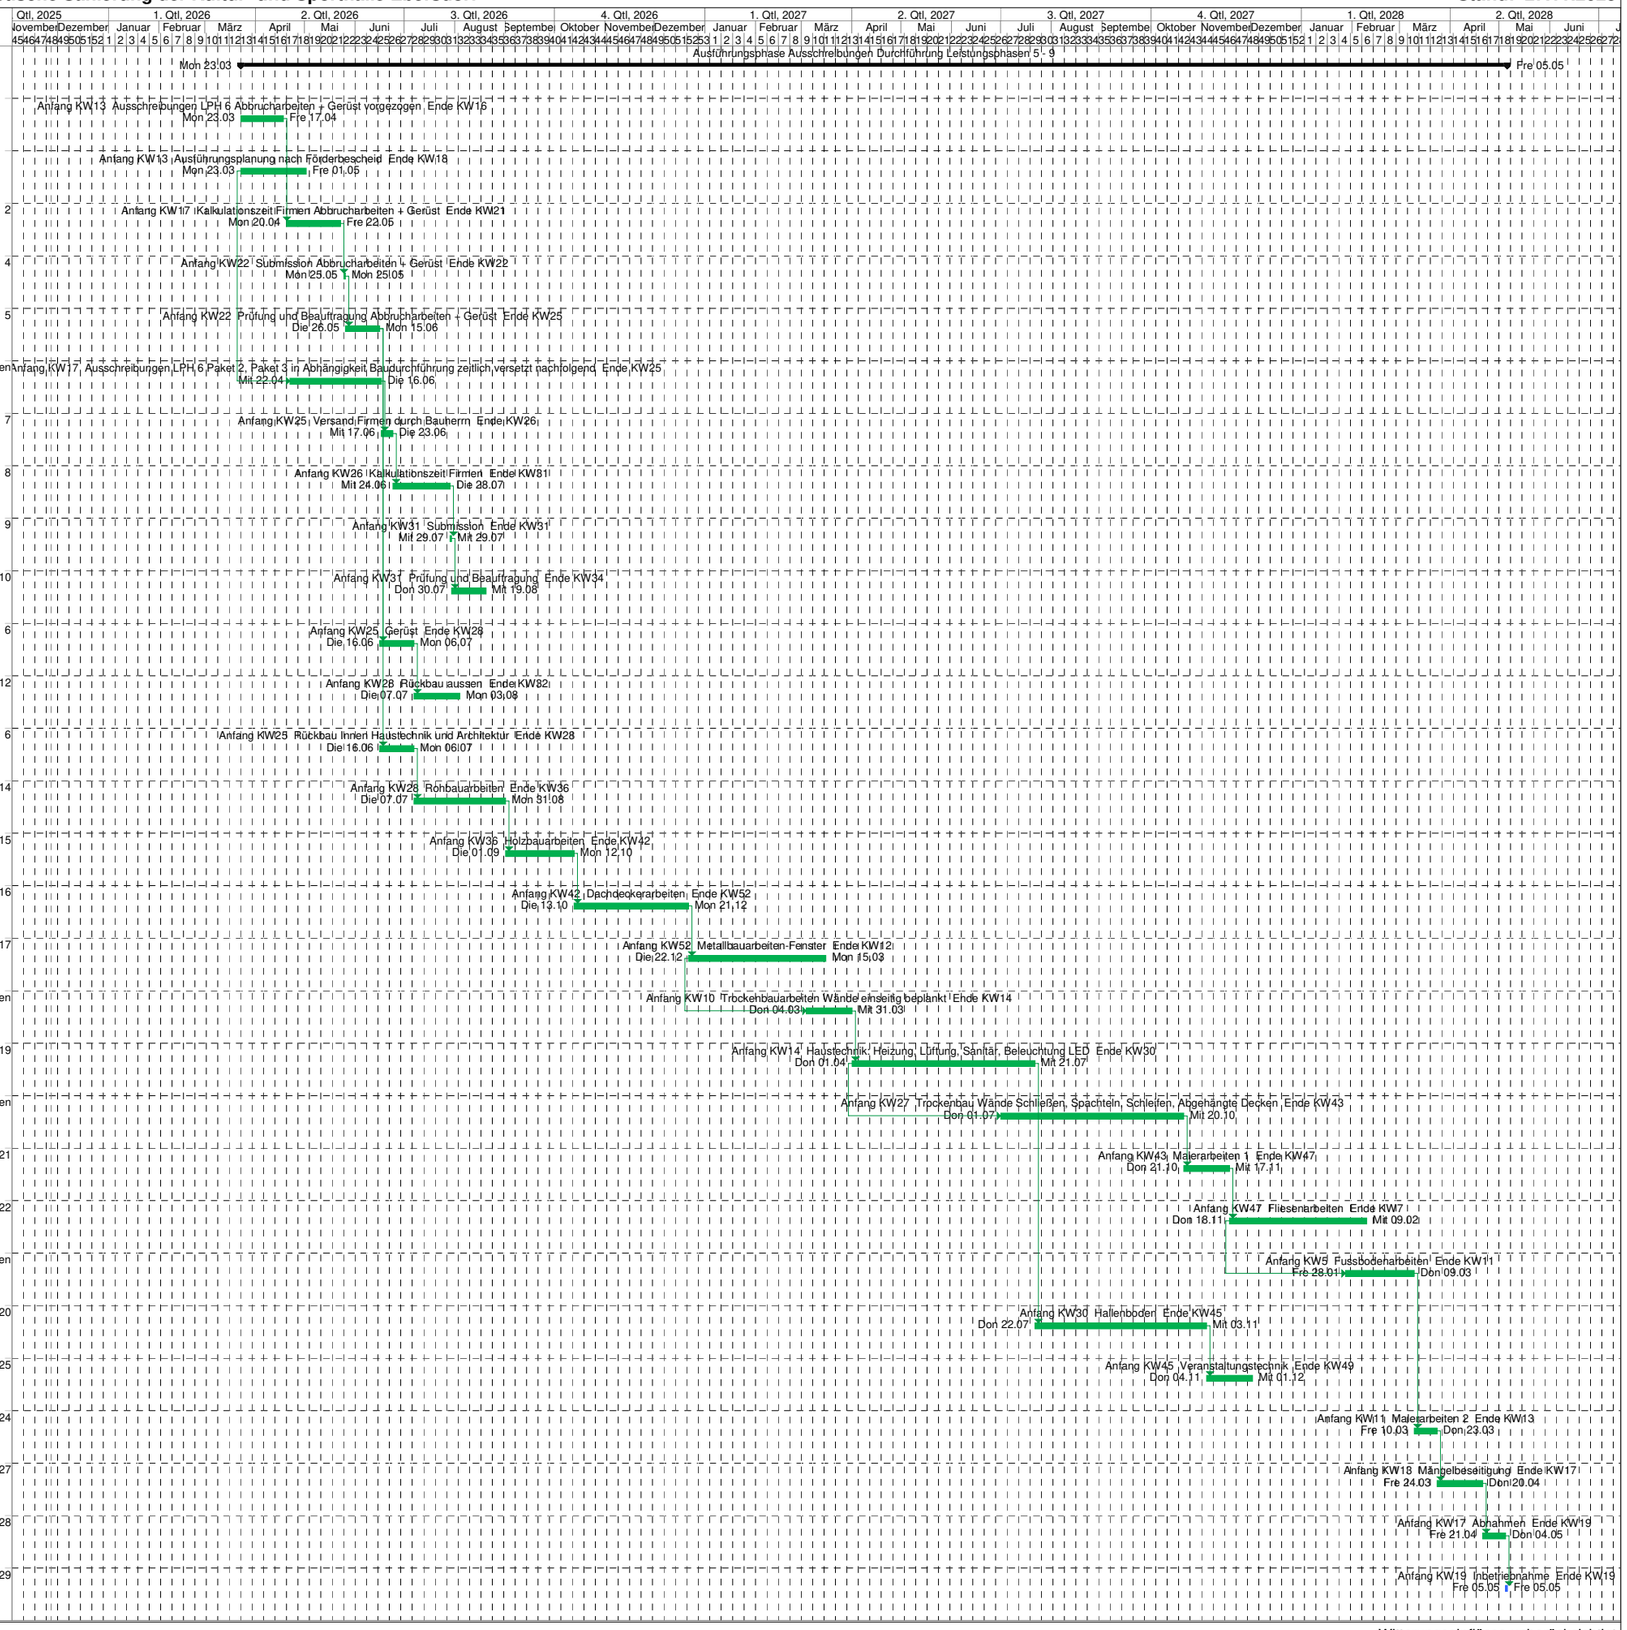
Nr.	Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	KW-Anf	Ende	KW Ende	Vorgänger
1	1	Ausführungsphase Ausschreibungen Durchführung Leistungsphasen 5 - 9	516 Tage	Mon 23.03.26		Fre 05.05.28		
2	2	Ausschreibungen LPH 6 Abbrucharbeiten + Gerüst vorgezogen	4 Wochen	Mon 23.03.26	KW13	Fre 17.04.26	KW16	
3	3	Ausführungsplanung nach Förderbescheid	6 Wochen	Mon 23.03.26	KW13	Fre 01.05.26	KW18	
4	4	Kalkulationszeit Firmen Abbrucharbeiten + Gerüst	5 Wochen	Mon 20.04.26	KW17	Fre 22.05.26	KW21	2
5	5	Submission Abbrucharbeiten + Gerüst	1 Tag	Mon 25.05.26	KW22	Mon 25.05.26	KW22	4
6	6	Prüfung und Beauftragung Abbrucharbeiten + Gerüst	3 Wochen	Die 26.05.26	KW22	Mon 15.06.26	KW25	5
7	7	Ausschreibungen LPH 6 Paket 2, Paket 3 in Abhängigkeit Baudurchführung zeitlich versetzt nachfolgend	8 Wochen	Mit 22.04.26	KW17	Die 16.06.26	KW25	3AA+4 Wochen
8	8	Versand Firmen durch Bauherrn	1 Woche	Mit 17.06.26	KW25	Die 23.06.26	KW26	7
9	9	Kalkulationszeit Firmen	5 Wochen	Mit 24.06.26	KW26	Die 28.07.26	KW31	8
10	10	Submission	1 Tag	Mit 29.07.26	KW31	Mit 29.07.26	KW31	9
11	11	Prüfung und Beauftragung	3 Wochen	Don 30.07.26	KW31	Mit 19.08.26	KW34	10
12	12	Gerüst	3 Wochen	Die 16.06.26	KW25	Mon 06.07.26	KW28	6
13	13	Rückbau aussen	4 Wochen	Die 07.07.26	KW28	Mon 03.08.26	KW32	12
14	14	Rückbau Innen Haustechnik und Architektur	3 Wochen	Die 16.06.26	KW25	Mon 06.07.26	KW28	6
15	15	Rohbauarbeiten	8 Wochen	Die 07.07.26	KW28	Mon 31.08.26	KW36	14
16	16	Holzbauarbeiten	6 Wochen	Die 01.09.26	KW36	Mon 12.10.26	KW42	15
17	17	Dachdeckerarbeiten	10 Wochen	Die 13.10.26	KW42	Mon 21.12.26	KW52	16
18	18	Metallbauarbeiten-Fenster	12 Wochen	Die 22.12.26	KW52	Mon 15.03.27	KW12	17
19	19	Trockenbauarbeiten Wände einseitig beplankt	4 Wochen	Don 04.03.27	KW10	Mit 31.03.27	KW14	18AA+8 Wochen
20	20	Haustechnik: Heizung, Lüftung, Sanitär, Beleuchtung LED	16 Wochen	Don 01.04.27	KW14	Mit 21.07.27	KW30	19
21	21	Trockenbau Wände Schließen, Spachteln, Schleifen, Abgehängte Decken	16 Wochen	Don 01.07.27	KW27	Mit 20.10.27	KW43	20AA+12 Wochen
22	22	Malerarbeiten 1	4 Wochen	Don 21.10.27	KW43	Mit 17.11.27	KW47	21
23	23	Fliesenarbeiten	12 Wochen	Don 18.11.27	KW47	Mit 09.02.28	KW7	22
24	24	Fussbodenarbeiten	6 Wochen	Fre 28.01.28	KW5	Don 09.03.28	KW11	23AA+8 Wochen
25	25	Hallenboden	15 Wochen	Don 22.07.27	KW30	Mit 03.11.27	KW45	20
26	26	Veranstaltungstechnik	4 Wochen	Don 04.11.27	KW45	Mit 01.12.27	KW49	25
27	27	Malerarbeiten 2	2 Wochen	Fre 10.03.28	KW11	Don 23.03.28	KW13	24
28	28	Mängelbeseitigung	4 Wochen	Fre 24.03.28	KW13	Don 20.04.28	KW17	27
29	29	Abnahmen	2 Wochen	Fre 21.04.28	KW17	Don 04.05.28	KW19	28
30	30	Inbetriebnahme	1 Tag	Fre 05.05.28	KW19	Fre 05.05.28	KW19	29
